



การบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2562-2563


กองบริหารการสาธารณสุข

29 August 2019

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ของสป.สร.ภูมิภาค ปี 2562

(ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

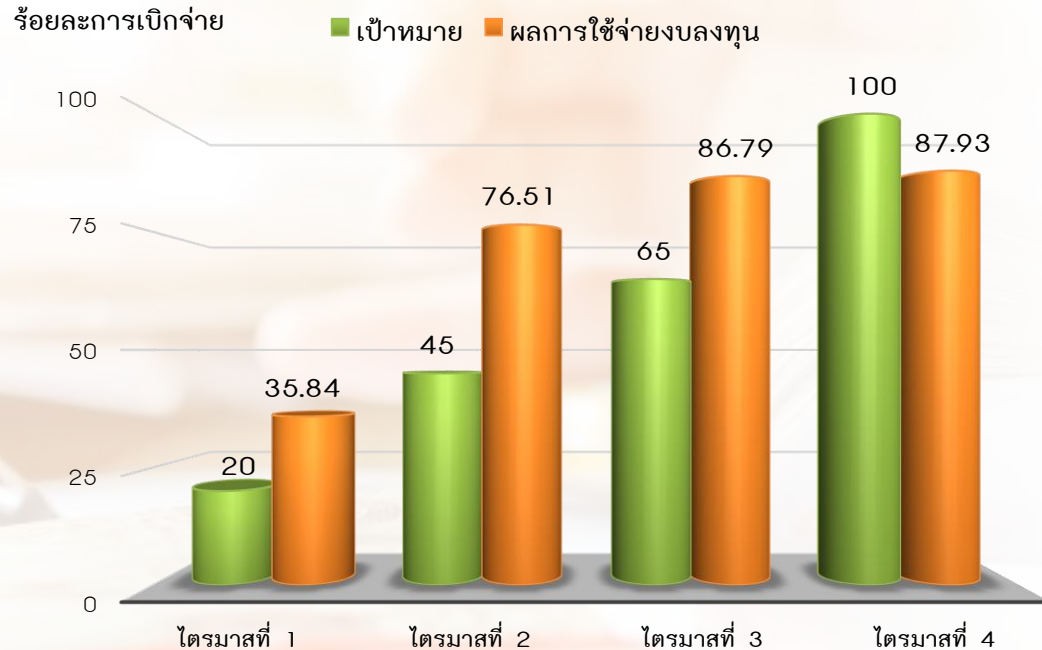

ผลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) --- 43.28%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ----- 44.65%

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ----- 87.93%

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน

- ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20
- ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45
- ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65
- ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100

ภาพรวมผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย
ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย
ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย

ร้อยละ (%)

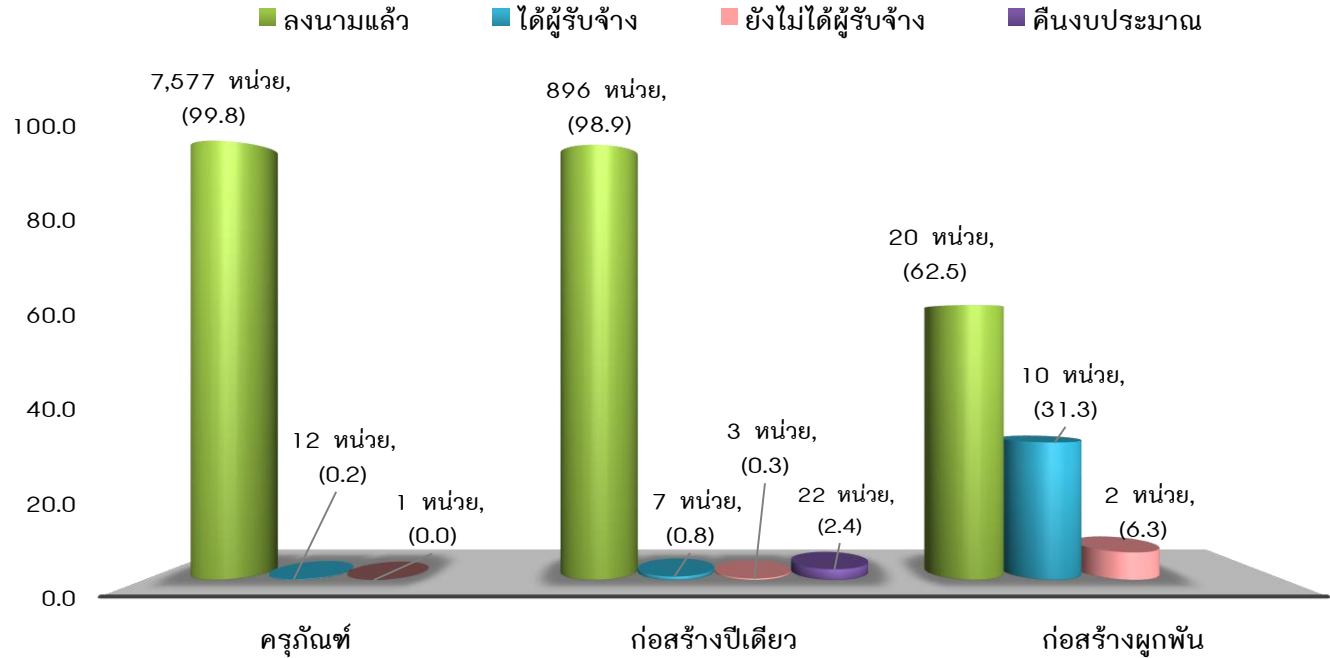

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

ปี 2562

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย

ลงนามแล้ว 7,577 หน่วย (99.83%)
 ได้ผู้รับจ้าง(รอลงนาม) 12 หน่วย (0.16%)
 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย (0.01%)
 คืบจนงบประมาณ 1 หน่วย (0.01%)

■ ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) ■ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ %

5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สบช. สบพช.

จำนวนทั้งสิ้น

211	666	190	1,037	610	659	395	448	475	1,421	356	998	39	86
-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	----

คืบจนงบประมาณ

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 12 หน่วย

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (วงเงิน 3,550,000 บาท)	รพ.กำแพงเพชร	รอหนังสือแจ้งผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
7	รถพยาบาล (รถตู้) (วงเงิน 2,000,000 บาท)	รพ.นามน จ.กาฬสินธุ์	กรมบัญชีกลางพิจารณาผล พรจ.อุทธรณ์แล้ว ปัจจุบันเสนอ ผวจ. เรียก พรจ.มาลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา 3 ก.ย.62
7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (วงเงิน 729,000 บาท)	รพ.หนองสูง จ.กาฬสินธุ์	พรจ.อุทธรณ์ เรื่องคุณลักษณะเฉพาะ ส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันรอผล การพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย.62
7	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. (วงเงิน 1,750,000 บาท)	รพ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	กรมบัญชีกลางพิจารณาผล พรจ.อุทธรณ์แล้ว ปัจจุบันเสนอ ผวจ. เรียก พรจ.มาลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา 3 ก.ย.62
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (วงเงิน 3,550,000 บาท)	รพ.คอนสาร/รพ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (2 หน่วย)	พรจ.อุทธรณ์ ส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง รอผลการพิจารณา ติดตามผลการอุทธรณ์ รอบที่ 2 ไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อ 25 มิ.ย.62 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลการพิจารณา
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ (วงเงิน 6,420,000 บาท)	รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	พรจ.อุทธรณ์ ส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง รอผลการพิจารณา ติดตามผลการ อุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อ 30 ก.ค.62 ยังไม่ทราบผลการพิจารณา

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

ปี 2562

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
10	หม้อแช่พาราฟิน (วงเงิน 54,000 บาท)	รพ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	กรมบัญชีกลางตอบผลการพิจารณาเมื่อ 23 ส.ค.62 ผลการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้รพ.ดำเนินการซื้อขายต่อไปได้ คาดว่าจะลงนามสัญญา 2 ก.ย. 62
11	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง (วงเงิน 1,000,000 บาท)	รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสภาพพัฒนาฯ เนื่องจากบริษัทที่ผลิตยกเลิกการผลิต และไม่มีกรนำเข้า จึงขอเปลี่ยนรายการเป็นเครื่องวัดความดันภายในหลอดเลือด วงเงิน 950,000 บาท สภาพพัฒนาเห็นชอบแล้วแจ้งจังหวัดเพื่อทราบแล้ว สงป.เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อ 6 ส.ค.62 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะนามสัญญา ก.ย. 62
11	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง (วงเงิน 1,000,000 บาท)	รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะนามสัญญา ส.ค. 62
11	เครื่องช่วยหายใจภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง (วงเงิน 2,500,000 บาท)	รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะนามสัญญา ส.ค. 62
11	เครื่องรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (วงเงิน 12,000,000 บาท)	รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ จะครบกำหนด 26 ส.ค. 62 คาดว่าจะนามสัญญา ก.ย. 62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (วงเงิน 1,700,000 บาท)	รพ.บ้านไร่ อุทัยธานี	ดำเนินการจัดซื้อใหม่เนื่องจากบอกลีกสัญญาผู้ขายรายเดิมเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 ยกเลิกสัญญา เนื่องจากพรจ.ทำงานอยู่ระหว่างต่อรองราคา และปรานกอกกฎหมายเรื่องใช้เงินบำรุงสมทบไม่เกิน 3% ของวงเงินที่เหลือ <u>(ครั้งที่ 1 ได้พรจ.แล้ว วงเงิน 1,580,000 บาท เหลือเงินคืบสน. 120,000 บาท พรจ.ไม่ส่งมอบงาน)</u> <u>ครั้งที่ 2 ได้ พรจ.แล้ว วงเงินเกินวงเงินที่มีอยู่เดิม อยู่ระหว่างปรึกษา</u> กอกกฎหมาย ใช้เงินบำรุงสมทบ)


ผลการดำเนินงาน งบลงทุน **คำสั่งก่อสร้างปีเดียว (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา**

ปี 2562

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย

ลงนามแล้ว 896 หน่วย (98.90%)
 ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 7 หน่วย (0.77%)
 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 3 หน่วย (0.33%)
 คืบจบประมาณ 22 หน่วย

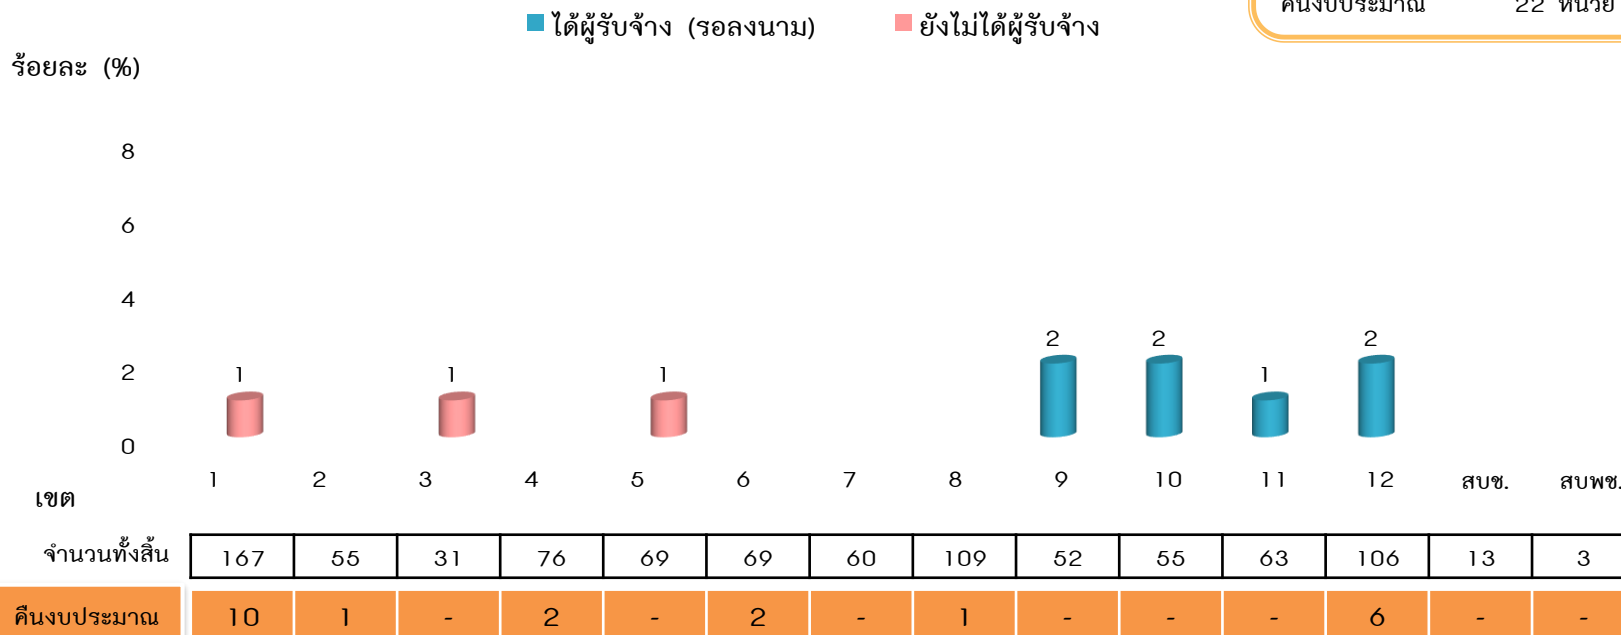

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน **คำสั่งก่อสร้างปีเดียว ที่ยังไม่ลงนามสัญญา**

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 7 หน่วย

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
๑	ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรวบรวมน้ำเสีย (วงเงิน 15,919,700 บาท)	รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	มีการอุทธรณ์จากผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากผู้เสนอไม่ยื่นสำเนาแสดงปริมาณวัสดุและราคามาด้วย ซึ่งเป็นสาระสำคัญในประกาศ กรมบัญชีกลางพิจารณาผลให้จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ และเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.62 คาดว่าจะลงนามสัญญา 17 ก.ย. 62
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (วงเงิน 1,210,100 บาท)	สสอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	มีการอุทธรณ์จากผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากผู้เสนอไม่ยื่นสำเนาแสดงปริมาณวัสดุและราคามาด้วย ซึ่งเป็นสาระสำคัญในประกาศ จ.นครราชสีมาได้ติดตามผลการอุทธรณ์ รอบที่ 2 ไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อ 28 มิ.ย.62 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลการพิจารณา คาดว่าจะลงนามสัญญา 30 ส.ค.62
10	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (วงเงิน 12,673,600 บาท)	สสจ.อำนาจเจริญ	พรจ.อุทธรณ์ รอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
10	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (วงเงิน 15,000,000 บาท)	รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	ยกเลิกการจัดจ้างครั้งที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่าง เสนอ นพ.สสจ.เพื่อลงนามถึง พว.จ.อนุมัติสั่งจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญา 6 ก.ย. 62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน **คำสั่งก่อสร้างปีเดียว** ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
11	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (วงเงิน 1,193,000 บาท)	สสอ.กระบุรี จ.ระนอง	เสนอ ผวจ.เพื่อขอจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
12	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (วงเงิน 9,830,700 บาท)	รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี	ขอสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (เงินเหลือจ่าย) เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนที่เกินร้อยละ 10 ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเมื่อ 22 ส.ค.62 แจ้งจังหวัดดำเนินการแล้ว
12	อาคารสถานีนอนมัย (วงเงิน 3,100,000 บาท)	รพ.สต.บ้านตันหยงกลิง จ.สตูล	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ ได้ดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติม (เงินเหลือจ่าย) ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเมื่อ 13 ส.ค. 62 อยู่ระหว่างแจ้ง ผวจ. มาลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ส.ค. 62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน **คำสั่งก่อสร้างปีเดียว ที่ยังไม่ลงนามสัญญา**

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 3 หน่วย

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
1	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (วงเงิน 17,510,000 บาท)	รพร.เด่นชัย จ.แพร่	แก้ไขราคากลาง เนื่องจากตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ขอให้ปรับราคากลาง ปัจจุบัน เสนอรายงานผลการพิจารณา พรจ. เมื่อ 14 ส.ค.62 วงเงิน 15.72 ลบ. คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
3	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (วงเงิน 13,011,000 บาท)	สสจ.อุทัยธานี	ดำเนินการจัดจ้างใหม่ครั้งที่ 2 เนื่องจาก ครั้งที่ 1 สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงนามเมื่อ 27 ธ.ค.61 พรจ.ไม่เข้าดำเนินการ จึงยกเลิกสัญญาเดิมและดำเนินการ ใหม่ครั้งที่ 2 ปัจจุบันไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คาดว่าจะคืบหน้าประมาณ (พรจ.ทั้งงาน มีเงินเหลือ 12890300 บาท) ครั้งที่ 2 มีผู้ซื้อแบบ 6 ราย แต่ไม่ยื่น
5	ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (วงเงิน 41,400,000 บาท)	ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย (รพ.กระทุ่มแบน) จ.สมุทรสาคร	สงป.อนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย เมื่อ 2 ก.ค.62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง ประกาศ (19 ส.ค.62) เปิดซองเมื่อ 30 ส.ค. 62 คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย.62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน **คำสั่งก่อสร้างผูกพัน (รายเขต)** ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

ปี 2562


(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

จำนวนหน่วย

ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย



■ ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) ■ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

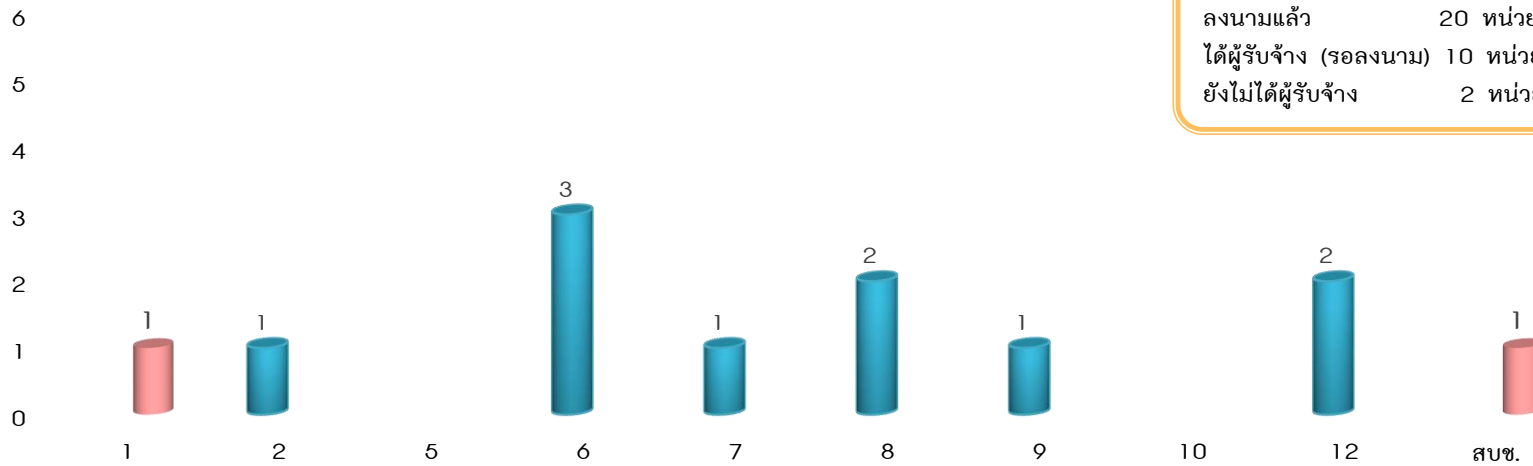

ลงนามแล้ว 20 หน่วย (62.50%)
 ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 10 หน่วย (31.25%)
 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 2 หน่วย (6.25%)

จำนวนหน่วย

1	3	5	9	1	5	3	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ **คำสั่งก่อสร้างผูกพัน ที่ยังไม่ลงนามสัญญา**

ปี 2562

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 10 หน่วย

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
2	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (วงเงิน 73,000,000 บาท)	รพ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยกเลิกครั้งที่ 2 ดำเนินการครั้งที่ 3 เนื่องจากจังหวัดคำนวณราคากลางผิด จึงขอถอนเรื่องคืนจาก สป. ได้ผู้รับจ้างแล้ว สป.อนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง 71.73 ลบ. และขยายเวลาจาก 2562 - 2563 เป็น 2562 -2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ รมต. ขอย้ายเวลา คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย.62
6	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) (วงเงิน 103,819,900 บาท)	รพ.บ้านปิง จ.ชลบุรี	ได้ราคากลางและได้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผล ผวจ. แล้ว รมต.อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างจากปี 62-63 เป็นปี 62-64 ปัจจุบันรอ ผวจ.ลงนามประกาศผลผู้ชนะและเปิดระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันก่อนลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (วงเงิน 78,733,800 บาท)	รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทำ EIA (การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ก่อนการลงนามสัญญา
6	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (วงเงิน 308,191,400 บาท)	รพ.สระแก้ว จ.สระแก้ว	ได้ราคากลางแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว สป.เห็นชอบราคากลางแล้ว รมต.อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้ว และส่งหนังสือแจ้งจังหวัดแล้ว ผวจ.ลงนามสัญญาแล้ว ปัจจุบันเสนอพ.สจ. เพื่อลงนามถึง ผวจ. ลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา 20 ก.ย. 62

ผลการดำเนินงาน จบลงทุน คำสั่งก่อสร้างผูกพัน ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น (วงเงิน 181,000,000 บาท)	รพ.กระนวน จ.ขอนแก่น	ได้ราคากลางเมื่อ 1 ก.ค. 62 ได้ผู้รับจ้างแล้วรสป.เห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อ 22 ส.ค. 62 อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งจังหวัด คาดว่าจะลงนาม 15 ก.ย.62
8	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น (วงเงิน 130,129,900 บาท)	รพ.สกลนคร จ.สกลนคร	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รสป.เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างเมื่อ 28 ก.พ.62 ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผู้รับจ้าง เมื่อ 2 เม.ย.62 กรมบัญชีกลางแจ้งผลหารือคุณสมบัติผู้รับจ้าง ฟังไม่ขึ้น จังหวัดจึงดำเนินการรอลงนามสัญญาได้ คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62
8	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น (วงเงิน 889,036,000 บาท)	รพ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้ราคากลางแล้ว รสป.เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง 795 ลบ. และรสป.อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากปี 62-64 เป็น 62-65 เมื่อ 17 มิ.ย.62 ปลัดอนุมัติสั่งจ้างเมื่อ 19 มิ.ย.62 จังหวัดประกาศผล พรจ. มี พรจ.รายอื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับวงเงินการเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำเรื่องไปกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน คำสั่งก่อสร้างผูกพัน ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
๑	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (วงเงิน 700,000,000 บาท)	รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	ส่งป.เห็นชอบราคากลางแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน ๖07 ลบ. กองบริหารการคลังและกองกฎหมายตรวจสอบตามระเบียบแล้ว พบว่า กฎหมายมีประเด็นขอให้ชี้แจง 1. บริษัทที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล 2. ราคาที่จัดจ้างได้ต่ำกว่าราคากลาง 21% ต้องรายงาน สดง. 3. BOQ ของผู้รับจ้างกับในระบบต่างกัน จึงให้จังหวัดชี้แจง และอยู่ระหว่างหารือกองแบบเรื่องโครงสร้างตึก เมื่อ 18 ก.ค.62 ปัจจุบันแจ้งจังหวัดครั้งที่ 2 เมื่อ 9 ส.ค. 62 ให้ทบทวนผลการพิจารณาผลประกวดราคาจ้าง ในเรื่องผลงานการก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญา 23 ต.ค. 62
12	อาคารวินิจัยและรักษา (วงเงิน 608,279,200 บาท)	รพ.ตรัง จ.ตรัง	ได้ราคากลางจังหวัดและได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่งป.เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อ 25 มี.ค.62 วงเงิน 518,000,000 บาท รวมนุ้มนิตขยายเวลาก่อสร้าง จาก ปี 62-64 เป็น 62-65 และปลดอนุ้มนิตสั่งจ้าง เมื่อ 10 ก.ค.62 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ส.ค. 62
12	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๑6 ยูนิต 8 ชั้น (วงเงิน 135,667,000 บาท)	รพ.ยะลา จ.ยะลา	ได้ราคากลางแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่งป.เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อ 17 มิ.ย.62 รวมนุ้มนิตขยายเวลาก่อสร้างแล้ว ผดท. อนุ้มนิตสั่งจ้าง เมื่อ 18 ก.ค.62 ปัจจุบันรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ส.ค. 62

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน คำสั่งก่อสร้างผูกพัน ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

(ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ปี 2562

ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 2 หน่วย


เขต	รายการ	สถานที่	การดำเนินงาน
1	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (วงเงิน 188,021,800 บาท)	รพ.สูงเม่น จ.แพร่	สงป.เห็นชอบให้ย้ายสถานที่ก่อสร้าง ได้ราคากลางแล้ว ปัจจุบันเสนอหนังสือขอความเห็นชอบราคากลางใหม่ ไปยัง สงป. เมื่อ 23 ส.ค.62 คาดว่าจะลงนามสัญญาไม่ทันภายใน 29 ต.ค. 62
สบข.	อาคารศูนย์การเรียนรู้ (วงเงิน 306,234,400 บาท)	วพบ.สุพรรณบุรี	อยู่ระหว่างจัดจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR เปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามสัญญาเป็นอธิการบดี คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ย. 62

ภาพรวมการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปี 2563

กองบริหารการสาธารณสุข บันทึกรายละเอียดรายการและวงเงินในระบบ E-budgeting เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
วงเงินรวมทั้งสิ้น 22,646.58 ลบ.

ภาพรวมรายการใหม่ปี 2563

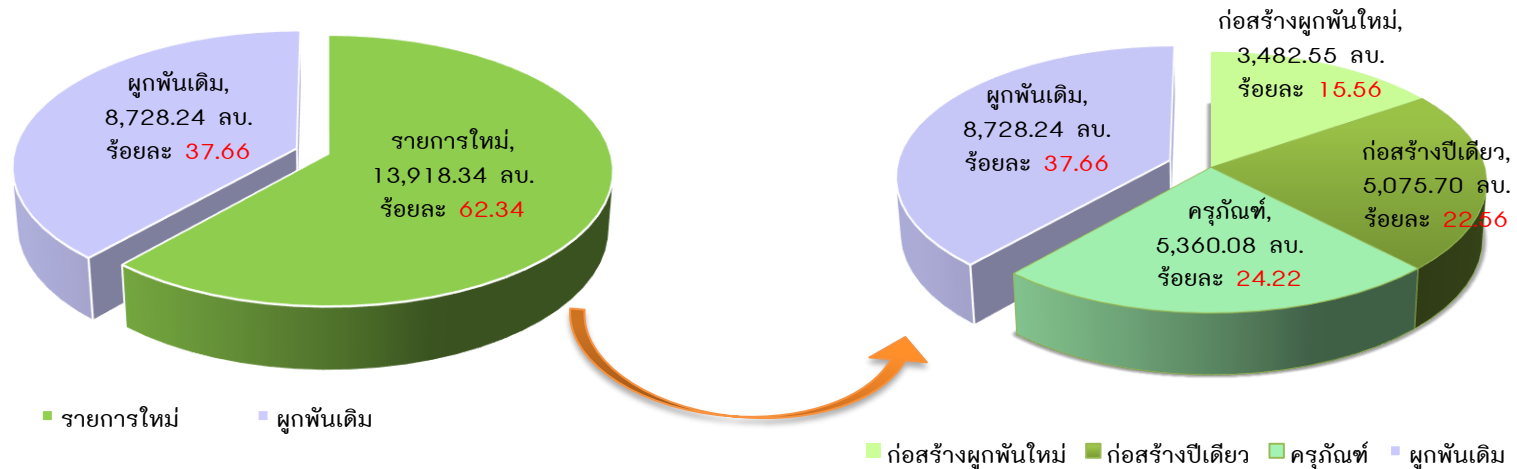

ภาพรวมการจัดทำคำขอของบลงทุนตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562)

ปี 2563

แผนงานบูรณาการ (1,895.55 ลบ.)

- 
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (564.44 ลบ.)
 2. แผนงานบูรณาการ EEC (322.03 ลบ.)
 3. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (1,009.09 ลบ.)
 - ภาคเหนือ 202.10 ลบ.
 - ภาคกลาง 118.77 ลบ.
 - ภาคตะวันออก 121.71 ลบ.
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200.03 ลบ.
 - ภาคใต้ 162.17 ลบ.
 - ภาคใต้ชายแดน 204.31 ลบ.

แผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์ (20,751.03 ลบ.)


- 
1. Service Plan 9,725.03 ลบ.
 2. บริหาร 754.69 ลบ.
 3. ชายแดนใต้ 710.74 ลบ.
 4. น้ำเสีย 531.66 ลบ.
 5. พัฒนาหน่วยปฐมภูมิ 432.00 ลบ.
 6. เกล็ดพระเกียรติ 343.61 ลบ.
 7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 130.70 ลบ.
 8. พัฒนาระบบข้อมูล 6.20 ลบ.

*** ผูกพันเดิม 7,735.45 ลบ. ***

*** เงินผูกพันเดิมถูกพับ 380.48 ลบ. ***

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2563

ปี 2563

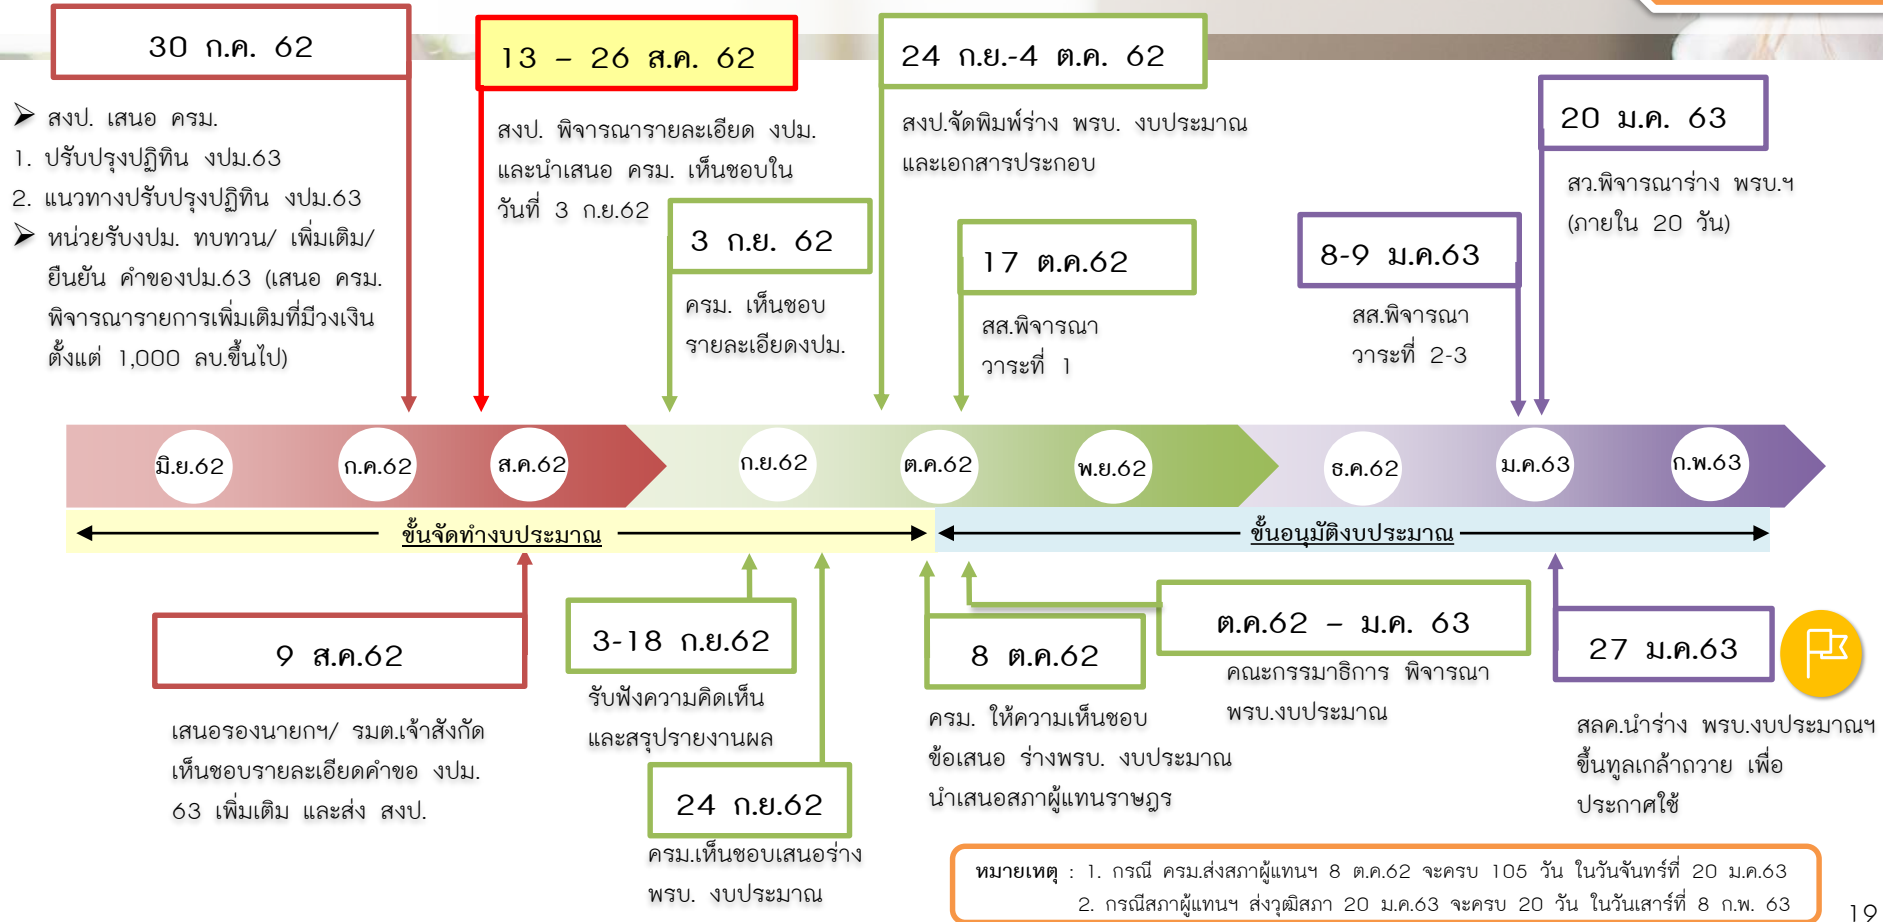



Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข
